

工事原価管理システム

二の丸V4

基本システム 出力サンプル集

石田データサービス株式会社

【 目 次 】

【原価管理】

物件一覧表	3
実行予算書	4
内訳リスト	5
完成工事一覧表 (工事番号順)	6 ~ 8
受注先別完成工事一覧表	9
担当者別完成工事一覧表	10
未成工事一覧表 (工事番号順)	11 ~ 13
受注先別未成工事一覧表	14
担当者別未成工事一覧表	15
工事集計表 (部門別)	16 ~ 20
工事台帳 (実行予算付)	21
工事台帳 (分類名別)	22
工事台帳 (取引先別)	23
工事台帳 (明細)	24 ~ 25
工事台帳 (月別分類集計)	26
工事台帳 (表紙)	27
工事台帳 (材料集計)	28
工事台帳 (分類別明細)	29
工事台帳 (業者別明細)	30

【支払管理】


支払一覧表	54
支払予定表	55
仕入元帳 (支払付)	56
買掛残高一覧	57

仕入元帳	31
仕入一覧表	32
月別仕入先一覧表	33
仕入先別工事一覧表	34
外注元帳	35
外注先一覧表	36
月別外注先一覧表	37
外注先別工事一覧表	38
経費取引先元帳	39
経費取引先一覧表	40
経費取引先別工事一覧表	41
月別経費取引先一覧表	42
月別経費明細一覧表	43
労務費工事一覧表 (工事別)	44
労務費工事一覧表 (担当者別)	45
労務月報	46
労務日報 (日付順 担当者別 工事別)	47 ~ 49
在庫一覧表	50
在庫マスタリスト	51
在庫更新リスト	52

【マスタ管理】

資材マスタリスト	59
実行予算分類名マスタ	60
受注先マスタリスト	61
業者マスタリスト	62

原価管理 (C)

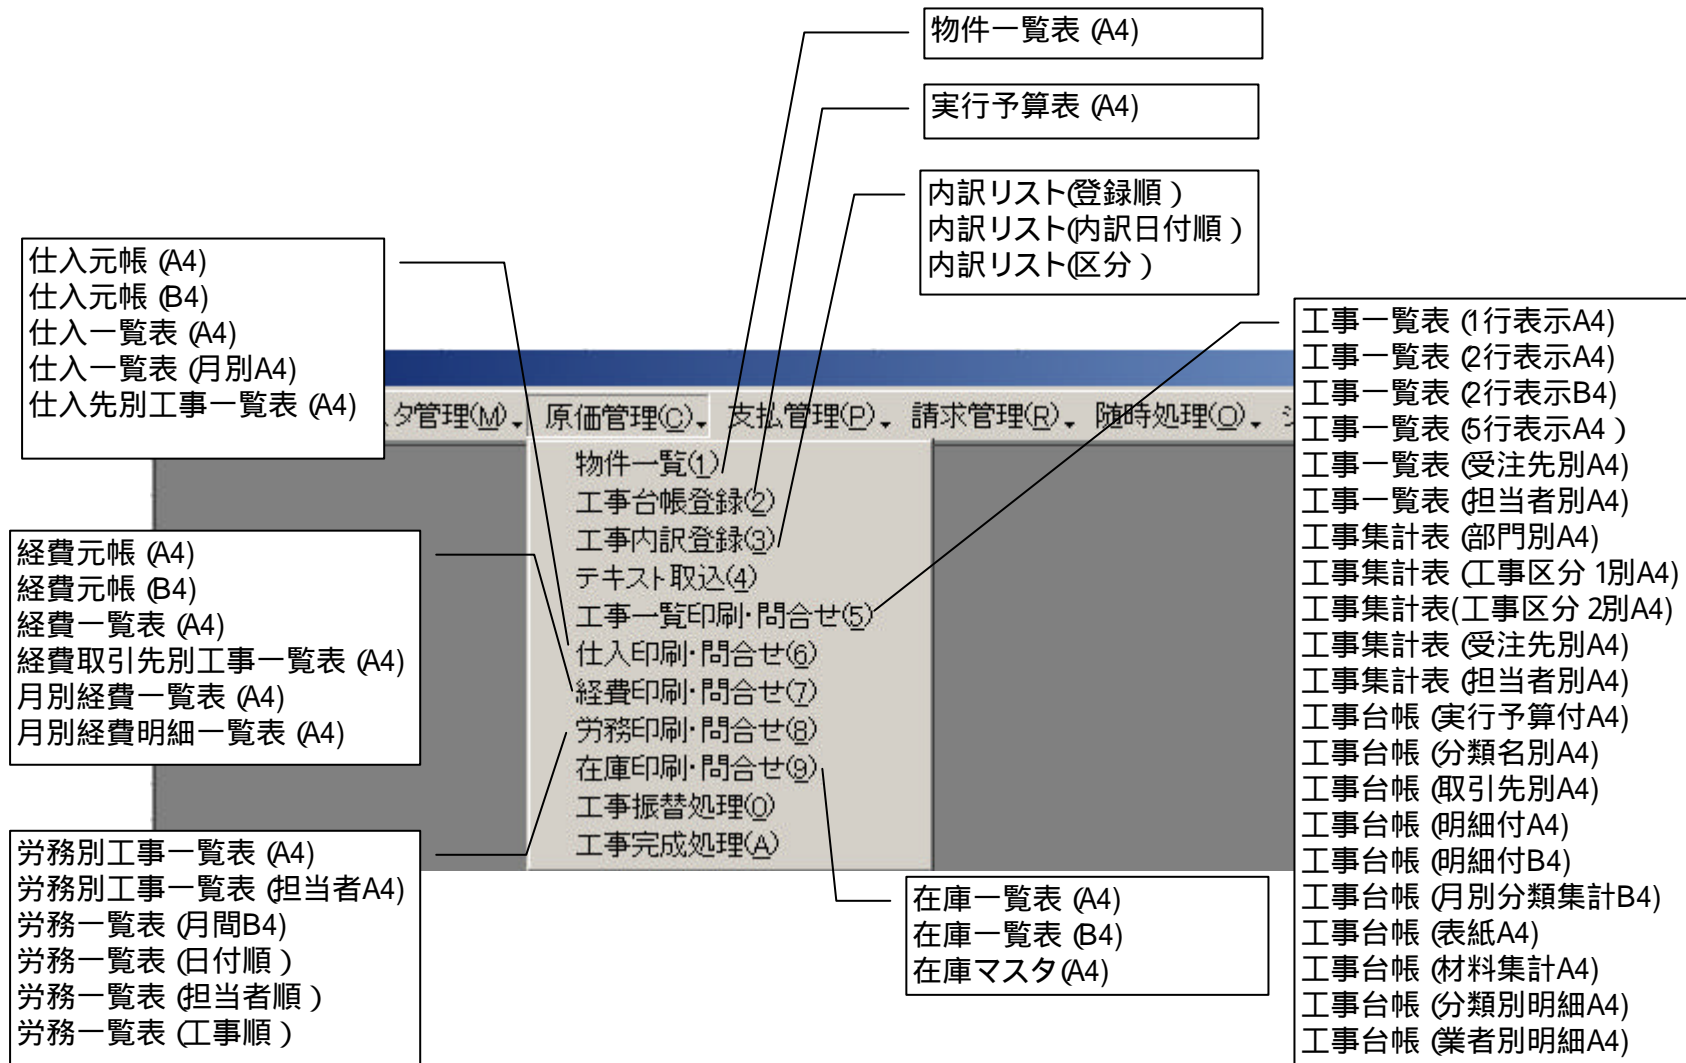

日付	仕入先	工事名称	分類	品名	規格	数量	単価	金額	備考1	備考2	備考3	入力時間	端末
2003/01/02	仕:0005 本丸電設工業	00000005 橋本邸改修工事		ねじなし電線管	EP-31	20.00 m	183.00	3,660				2002/09/30 15:16	MAPL E700
2003/01/02	仕:0006 ABCD機材有限会社	00000005 橋本邸改修工事	102 ボックス類	透明ジョイントボックス	大丸型	100.00 個	51.00	5,100				2002/09/30 15:16	MAPL E700
2003/01/02	外:0003 松上電気工業	00000005 橋本邸改修工事	255 塗装費	塗装費		2.00 式	10,000.00	20,000				2002/09/30 15:17	MAPL E700
2003/02/02	仕:0005 本丸電設工業	00000005 橋本邸改修工事		ねじなし電線管	EP-31	25.00 m	183.00	4,575				2002/09/30 15:17	MAPL E700
2003/02/02	仕:0006 ABCD機材有限会社	00000005 橋本邸改修工事	102 ボックス類	透明ジョイントボックス	大丸型	100.00 個	51.00	5,100				2002/09/30 15:18	MAPL E700
2003/02/02	外:0003 松上電気工業	00000005 橋本邸改修工事	255 塗装費	塗装費		2.50 式	10,000.00	25,000				2002/09/30 15:18	MAPL E700
2003/01/02	労	00000005 橋本邸改修工事	313 労務費	佐野	通常	2.50 時間	2,000.00	5,000				2002/09/30 15:20	MAPL E700
2003/02/02	労	00000005 橋本邸改修工事	313 労務費	佐野	残業	2.00 時間	4,000.00	8,000				2002/09/30 15:20	MAPL E700
2003/01/02	経:0003 石峰リース	00000005 橋本邸改修工事	441 O A レンタル費	レンタル		2.50 式	5,500.00	13,750				2002/10/03 15:03	MAPL E700
2003/02/02	経:0003 石峰リース	00000005 橋本邸改修工事	441 O A レンタル費	レンタル		4.50 式	5,500.00	24,750				2002/10/03 15:03	MAPL E700
2003/01/02	外:0001 株式会社武富塗装工業	00000001 (仮称)コーポ新築電気設備工事	510 保温・塗装・錆工事	塗装費		4.00 式	10,000.00	40,000				2002/12/17 16:28	MAPL E700
2003/02/02	外:0001 株式会社武富塗装工業	00000001 (仮称)コーポ新築電気設備工事	510 保温・塗装・錆工事	塗装費		4.00 式	10,000.00	40,000				2002/12/17 16:28	MAPL E700
2003/01/02	経:0001 イワイ事務機	00000001 (仮称)コーポ新築電気設備工事	800 現場経費	レンタル		4.00 式	5,500.00	22,000				2002/12/18 10:52	MAPL E700
2003/02/02	経:0001 イワイ事務機	00000001 (仮称)コーポ新築電気設備工事	800 現場経費	レンタル		2.50 式	5,500.00	13,750				2002/12/18 10:52	MAPL E700
				【 合計 】		276		230,685					

完成工事一覧表

2003年 1月18日 1 頁

抜出内訳日：

契約金額：

完成日： 2002年 4月 1日 ~ 2002年12月31日

工事番号	工 事 名	受 注 先	契約金額	実行予算	実行額	消化率	一般管理費	粗利額	利益率	完成日
00000001	(仮称)コーポビル新築電気設備工事	いろはに電気設備工業株式会社	1,450,000	1,287,000	1,418,463	110.2%	116,000	84,463		2002/11/30
00000002	DEMOKビル新築電気設備工事	A B C 宮路商事株式会社	2,925,000	2,440,000	2,617,749	107.3%	16,000	291,251	10.0%	2002/12/28
00000003	森本邸新築電気設備工事	青田興業有限会社	2,000,000	1,800,000	1,603,360	89.1%	24,000	372,640	18.6%	2002/ 9/18
00000004	山本邸改修工事	石田工務店	1,100,000	800,000	663,500	82.9%	8,000	428,500	39.0%	2002/ 9/30
00000007	ビル新築電気設備工事	有限会社川崎興産	250,000	140,000	140,000	100.0%	20,000	90,000	36.0%	2002/ 8/31
00000009	(仮称)Aマンション新築電気設備工事	有限会社岡信興産	100,000	70,000	30,600	43.7%	8,000	61,400	61.4%	2002/ 9/30
00000010	A A A A Aビル新築電気設備工事	竹内産業	350,000	300,000	285,950	95.3%	17,500	46,550	13.3%	2002/ 8/29
00000012	湯浅邸新築電気設備工事	中田株式会社	500,000	450,000	428,980	95.3%	0	71,020	14.2%	2002/10/29
00000014	邸電気工事	川辺電気店	169,000	100,000	125,230	125.2%	0	43,770	25.9%	2002/ 9/17
00000016	A B C印刷株式会社 広島工場新築電気設備工事	いろはに電気設備工業株式会社	400,000	350,000	372,200	106.3%	32,000	4,200		2002/ 8/24
00000017	病院改修工事	いろはに電気設備工業株式会社	200,000	100,000	43,450	43.5%	8,000	148,550	74.3%	2002/ 9/17
00000018	病院改築工事	有限会社川崎興産	200,000	100,000	62,430	62.4%	16,000	121,570	60.8%	2002/10/ 3
00000020	×××工場補修工事	いろはに電気設備工業株式会社	150,000	75,000	97,550	130.1%	12,000	40,450	27.0%	2002/ 8/31
00000021	井上隆行邸 屋根・下水・床下清掃	商事有限会社	38,000	23,000	44,200	192.2%	1,040	7,240		2002/10/26
00000022	岡田公民館 トイレ改修工事	有限会社岡信興産	100,000	0	15,000		0	85,000	85.0%	2002/10/31
00000024	本山マンション 電話工事	有限会社川崎興産	150,000	0	22,500		0	127,500	85.0%	2002/12/16
00000031	井上隆行邸 ボイラーヘッド取替工事		13,000	6,000	7,500	125.0%	1,040	4,460	34.3%	2002/12/13
00000032	石田ビル新築電気設備工事	青田興業有限会社	31,000,000	24,410,000	23,742,352	97.3%	2,480,000	4,777,648	15.4%	2002/12/15
00000033	五月邸新築電気設備工事	恵比寿建設工業株式会社	30,000,000	25,900,000	27,877,442	107.6%	1,200,000	922,558	3.1%	2002/10/16
00000034	加田道ショーウルーム改装設備工事	有限会社岡信興産	3,800,000	3,300,000	3,250,000	98.5%	304,000	246,000	6.5%	2002/ 8/22
00000037	レストランGRAND電気設備工事	青田興業有限会社	1,300,000	1,000,000	214,000	21.4%	104,000	982,000	75.5%	2002/ 7/ 1
	【 合 計 】 21件		76,195,000	62,651,000	63,062,456	100.7%	4,367,580	8,764,964	11.5%	

完成工事一覧表

2003年 1月18日 1頁

抜出内訳日：

契約金額：

完成日： 2002年 4月 1日 ~ 2002年12月31日

工事番号	工事名	契約金額	材料費	労務費	外注費	経費	実行予算 実行額	消化率	一般管理費 粗利額	利益率	完成日 担当者
00000001	(仮称)コーポ井上新築電気設備工事	1,450,000	697,000	250,000	220,000	120,000	1,287,000		116,000		2002/11/30
			666,713	183,750	340,000	228,000	1,418,463	110.2%	84,463		山田
00000002	DEMOビル新築電気設備工事	2,925,000	1,030,000	760,000	480,000	170,000	2,440,000		16,000		2002/12/28
			1,086,869	950,500	440,000	140,380	2,617,749	107.3%	291,251	10.0%	山田
00000003	森本邸新築電気設備工事	2,000,000	1,000,000	200,000	500,000	100,000	1,800,000		24,000		2002/ 9/18
			906,360	150,000	460,000	87,000	1,603,360	89.1%	372,640	18.6%	飯田
00000004	山本邸改修工事	1,100,000	500,000	100,000	100,000	100,000	800,000		8,000		2002/ 9/30
			434,000	86,500	75,000	68,000	663,500	82.9%	428,500	39.0%	山田
00000007	Dビル新築電気設備工事	250,000	0	0	140,000	0	140,000		20,000		2002/ 8/31
			0	0	140,000	0	140,000	100.0%	90,000	36.0%	山田
00000009	(仮称)Aマンション新築電気設備	100,000	30,000	10,000	0	30,000	70,000		8,000		2002/ 9/30
			30,600	0	0	0	30,600	43.7%	61,400	61.4%	飯田
00000010	AAAAAビル新築電気設備工事	350,000	300,000	0	0	0	300,000		17,500		2002/ 8/29
			285,950	0	0	0	285,950	95.3%	46,550	13.3%	浜崎
00000012	湯浅邸新築電気設備工事	500,000	450,000	0	0	0	450,000		0		2002/10/29
			428,980	0	0	0	428,980	95.3%	71,020	14.2%	山田
00000014	邸電気工事	169,000	100,000	0	0	0	100,000		0		2002/ 9/17
			89,230	36,000	0	0	125,230	125.2%	43,770	25.9%	飯田
00000016	ABC印刷株式会社 広島工場新築電気設備工事	400,000	350,000	0	0	0	350,000		32,000		2002/ 8/24
			341,200	28,000	0	3,000	372,200	106.3%	4,200		山田
00000017	病院改修工事	200,000	50,000	20,000	20,000	10,000	100,000		8,000		2002/ 9/17
			43,450	0	0	0	43,450	43.5%	148,550	74.3%	浜崎
00000018	病院改築工事	200,000	100,000	0	0	0	100,000		16,000		2002/10/ 3
			62,430	0	0	0	62,430	62.4%	121,570	60.8%	山田
00000020	xxx工場補修工事	150,000	75,000	0	0	0	75,000		12,000		2002/ 8/31
			97,550	0	0	0	97,550	130.1%	40,450	27.0%	浜崎
00000021	井上隆行邸 屋根・下水・床下清掃	38,000	0	18,000	0	5,000	23,000		1,040		2002/10/26
			0	21,000	0	23,200	44,200	192.2%	7,240		田中

完成工事一覧表

2003年 1月18日 1 頁

抜出内訳日：

契約金額：

完成日： 2002年 4月 1日 ~ 2002年12月31日

工 事 名		実行予算	実行額	差 額	消化率	一般管理費 粗利額	利益率	担当 / 着工日 / 完成予定日 完成日
00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事 いろはに電気設備工業株式会社 建築下請 新築 電気工事部	材料費	697,000	666,713	30,287	95.7%			山田
	労務費	250,000	183,750	66,250	73.5%			2002/ 8/ 1
	外注費	220,000	340,000	120,000	154.5%	116,000		2002/11/10
	経 費	120,000	228,000	108,000	190.0%			
	契約金額	1,450,000	1,287,000	1,418,463	131,463	110.2%	84,463	
00000002 DEMOL'ル新築電気設備工事 A B C 宮路商事株式会社 建築下請 新築 電気工事部	材料費	1,030,000	1,086,869	56,869	105.5%			山田
	労務費	760,000	950,500	190,500	125.1%			2002/ 8/ 1
	外注費	480,000	440,000	40,000	91.7%	16,000		2002/12/28
	経 費	170,000	140,380	29,620	82.6%			
	契約金額	2,925,000	2,440,000	2,617,749	177,749	107.3%	291,251	10.0%
00000003 森本邸新築電気設備工事 青田興業有限会社 建築下請 新築 電気工事部	材料費	1,000,000	906,360	93,640	90.6%			飯田
	労務費	200,000	150,000	50,000	75.0%			2002/ 8/ 1
	外注費	500,000	460,000	40,000	92.0%	24,000		2002/ 8/31
	経 費	100,000	87,000	13,000	87.0%			
	契約金額	2,000,000	1,800,000	1,603,360	196,640	89.1%	372,640	18.6%
00000004 山本邸改修工事 石田工務店 住宅元請 改修 設備工事部	材料費	500,000	434,000	66,000	86.8%			山田
	労務費	100,000	86,500	13,500	86.5%			2002/ 8/ 1
	外注費	100,000	75,000	25,000	75.0%	8,000		2002/ 8/31
	経 費	100,000	68,000	32,000	68.0%			
	契約金額	1,100,000	800,000	663,500	136,500	82.9%	428,500	39.0%
00000007 Dビ'ル新築電気設備工事 有限会社川崎興産 住宅元請 新築 設備工事部	材料費	0	0	0				山田
	労務費	0	0	0				2002/ 7/ 1
	外注費	140,000	140,000	0	100.0%	20,000		2002/ 8/31
	経 費	0	0	0				
	契約金額	250,000	140,000	140,000	0	100.0%	90,000	36.0%
00000009 (仮称) A マンション新築電気設備 有限会社岡信興産 住宅元請 新築 設備工事部	材料費	30,000	30,600	600	102.0%			飯田
	労務費	10,000	0	10,000				2002/ 8/ 1
	外注費	0	0	0		8,000		2002/ 8/31
	経 費	30,000	0	30,000				
	契約金額	100,000	70,000	30,600	39,400	43.7%	61,400	61.4%

担当者別完成工事一覧表

2003年 1月18日 1 頁

山田

契約金額：

抜出内訳日：

完成日： 2002年 4月 1日 ~ 2002年12月31日

工事番号	工 事 名	契約金額	材料費	労務費	外注費	経 費	実行予算 実行額	消化率	一般管理費 粗利額	利益率	完成日 担当者
00000001	(仮称)コーポ井上新築電気設備工事	1,450,000	697,000 666,713	250,000 183,750	220,000 340,000	120,000 228,000	1,287,000 1,418,463		116,000 84,463		2002/11/30 山田
00000002	DEMOビル新築電気設備工事	2,925,000	1,030,000 1,086,869	760,000 950,500	480,000 440,000	170,000 140,380	2,440,000 2,617,749	110.2% 107.3%	16,000 291,251		2002/12/28 山田
00000004	山本邸改修工事	1,100,000	500,000 434,000	100,000 86,500	100,000 75,000	100,000 68,000	800,000 663,500		8,000 428,500		2002/ 9/30 山田
00000007	Dビル新築電気設備工事	250,000	0 0	0 0	140,000 140,000	0 0	140,000 140,000		20,000 90,000		2002/ 8/31 山田
00000012	湯浅邸新築電気設備工事	500,000	450,000 428,980	0 0	0 0	0 0	450,000 428,980		0 71,020		2002/10/29 山田
00000016	A B C印刷株式会社 広島工場新築電気設備工事	400,000	350,000 341,200	0 28,000	0 0	0 3,000	350,000 372,200		32,000 4,200		2002/ 8/24 山田
00000018	病院改築工事	200,000	100,000 62,430	0 0	0 0	0 0	100,000 62,430		16,000 121,570		2002/10/ 3 山田
00000022	岡田公民館 トイレ改修工事	100,000	0 0	0 15,000	0 0	0 0	0 15,000		0 85,000		2002/10/31 山田
00000032	石田ビル新築電気設備工事	31,000,000	8,900,000 9,055,652	15,000,000 14,174,700	460,000 467,000	50,000 45,000	24,410,000 23,742,352		2,480,000 4,777,648		2002/12/15 山田
00000033	五月邸新築電気設備工事	30,000,000	11,900,000 11,873,210	11,000,000 12,382,100	2,000,000 2,392,000	1,000,000 1,230,132	25,900,000 27,877,442		1,200,000 922,558		2002/10/16 山田
	【 合 計 】 10件	67,925,000	23,927,000 23,949,054	27,110,000 27,820,550	3,400,000 3,854,000	1,440,000 1,714,512	55,877,000 57,338,116	102.6%	3,888,000 6,698,884	9.9%	

未成工事一覧表

2003年 1月18日 1 頁

抜出内訳日：

契約金額：

完成日：

工 事 名		実行予算	実行額	差 額	消化率	一般管理費 粗利率	利益率	担当 / 着工日 / 完成予定日 完成日
00000006 沢田邸新築電気設備工事 有限会社岡信興産 住宅元請 新築 電気工事部	材料費	1,500,000	79,100	1,420,900	5.3%			浜崎
	労務費	200,000	27,500	172,500	13.8%			2002/ 7/ 31
	外注費	50,000	20,000	30,000	40.0%	40,000		2003/ 3/ 31
	経 費	50,000	22,000	28,000	44.0%			
	契約金額	2,000,000	1,800,000	148,600	1,651,400	8.3%	1,811,400	90.6%
00000011 大上ビル新築工事 (電気・空調・衛生設備) 商事有限会社 ビル元請 新築 その他工事	材料費	2,100,000	688,140	1,411,860	32.8%			岡島
	労務費	2,180,000	0	2,180,000				2002/11/ 1
	外注費	1,560,000	0	1,560,000		600,000		2003/ 6/ 30
	経 費	754,000	0	754,000				
	契約金額	7,500,000	6,594,000	688,140	5,905,860	10.4%	6,211,860	82.8%
00000015 A A A マンション水漏れ工事 有限会社川崎興産 建築下請 改修	材料費	100,000	95,860	4,140	95.9%			岡島
	労務費	0	0	0				2002/ 9/ 24
	外注費	0	0	0		8,000		
	経 費	0	50,000	50,000				
	契約金額	100,000	100,000	145,860	45,860	145.9%	53,860	
00000019 ビル改修工事 いろはに電気設備工業株式会社 建築下請 改修 その他工事	材料費	250,000	28,750	221,250	11.5%			浜田
	労務費	100,000	0	100,000				
	外注費	50,000	0	50,000		8,000		
	経 費	20,000	0	20,000				
	契約金額	500,000	420,000	28,750	391,250	6.8%	463,250	92.7%
00000035 コーポ平川新築電気設備工事 恵比寿建設工業株式会社 建築下請 新築 電気工事部	材料費	1,380,000	0	1,380,000				飯田
	労務費	890,000	484,500	405,500	54.4%			2002/ 6/ 3
	外注費	0	0	0		200,000		2003/ 6/ 30
	経 費	160,000	0	160,000				
	契約金額	2,500,000	2,430,000	484,500	1,945,500	19.9%	1,815,500	72.6%
00000036 J K S - Aビル機械室改装工事 恵比寿建設工業株式会社 建築下請 改築 設備工事部	材料費	230,000	0	230,000				山田
	労務費	450,000	435,000	15,000	96.7%			
	外注費	0	0	0		84,000		
	経 費	50,000	0	50,000				
	契約金額	1,050,000	730,000	435,000	295,000	59.6%	531,000	50.6%

受注先別完成工事集計表

2003年 1月18日 1 頁

抜出内訳日：

契約金額：

完成日： 2002年 4月 1日～2002年12月31日

受注先名	契約金額	材料費	労務費	外注費	経費	実行予算 実行額	消化率	一般管理費 粗利額	利益率	件数
いろはに電気設備工業株式会社	2,200,000	1,172,000	270,000	240,000	130,000	1,812,000		168,000		
		1,148,913	211,750	340,000	231,000	1,931,663	106.6%	100,337	4.6%	4
A B C 宮路商事株式会社	2,925,000	1,030,000	760,000	480,000	170,000	2,440,000		16,000		
		1,086,869	950,500	440,000	140,380	2,617,749	107.3%	291,251	10.0%	1
青田興業有限会社	34,300,000	10,400,000	15,400,000	1,160,000	250,000	27,210,000		2,608,000		
		9,962,012	14,538,700	927,000	132,000	25,559,712	93.9%	6,132,288	17.9%	3
石田工務店	1,100,000	500,000	100,000	100,000	100,000	800,000		8,000		
		434,000	86,500	75,000	68,000	663,500	82.9%	428,500	39.0%	1
恵比寿建設工業株式会社	30,000,000	11,900,000	11,000,000	2,000,000	1,000,000	25,900,000		1,200,000		
		11,873,210	12,382,100	2,392,000	1,230,132	27,877,442	107.6%	922,558	3.1%	1
有限会社岡信興産	4,000,000	1,630,000	1,210,000	300,000	230,000	3,370,000		312,000		
		1,630,600	1,215,000	300,000	150,000	3,295,600	97.8%	392,400	9.8%	3
有限会社川崎興産	600,000	100,000	0	140,000	0	240,000		36,000		
		62,430	22,500	140,000	0	224,930	93.7%	339,070	56.5%	3
竹内産業	350,000	300,000	0	0	0	300,000		17,500		
		285,950	0	0	0	285,950	95.3%	46,550	13.3%	1
商事有限会社	38,000	0	18,000	0	5,000	23,000		1,040		
		0	21,000	0	23,200	44,200	192.2%	7,240		1
中田株式会社	500,000	450,000	0	0	0	450,000		0		
		428,980	0	0	0	428,980	95.3%	71,020	14.2%	1
川辺電気店	169,000	100,000	0	0	0	100,000		0		
		89,230	36,000	0	0	125,230	125.2%	43,770	25.9%	1
ｽﾀｰなし	13,000	4,000	2,000	0	0	6,000		1,040		
		6,000	1,500	0	0	7,500	125.0%	4,460	34.3%	1
【 合計 】	76,195,000	27,586,000	28,760,000	4,420,000	1,885,000	62,651,000		4,367,580		
		27,008,194	29,465,550	4,614,000	1,974,712	63,062,456	100.7%	8,764,964	11.5%	21

工事台帳 (実行予算付)

抜出内訳日:

完成日: 2002年 4月 1日 ~ 2002年12月31日

工事番号	00000001	支店	01	電気工事部
工事名称	(仮称)コ-ボ井上新築電気設備工事			
工事区分1	01	建築下請		
工事区分2	01	新築		
担当	01	山田		
受注先	0001	いるはに電気設備工業株式会社		
受注先担当者				
工事場所	××市××町1-1-1			
契約条件	別途打合せによる			
設計事務所	設計			
着工日	2002/08/01	完成予定日	2002/11/10	
完成日	2002/11/30	作成日	2002/08/01	
最終請求日	2002/12/30	請求合計額	1,522,500	
最終入金日	2003/01/31	入金合計額	1,522,500	

	契約日	契約額	消費税	契約額(税込)
初回契約	2002/08/01	1,000,000	50,000	1,050,000
追加契約1	2002/10/01	450,000	22,500	472,500
追加契約2		0	0	0
追加契約3		0	0	0
合計金額		1,450,000	72,500	1,522,500

	見積原価額	実行予算	工事原価	差額	消化率
材料費	1,160,000	697,000	666,713	30,287	95.7%
労務費	390,000	250,000	183,750	66,250	73.5%
外注費	300,000	220,000	340,000	120,000	154.5%
経費	0	120,000	228,000	108,000	190.0%
合計	1,850,000	1,287,000	1,418,463	131,463	110.2%

	(%)	金額
一般管理費	8.0	116,000
予定利益	3.2	47,000
純利益	-5.8	84,463

分類 仕入先/外注先

分類	仕入先/外注先	見積原価額	実行予算	工事原価	差額	消化率
労務		390,000	250,000	183,750	66,250	73.5%
【計】		390,000	250,000	183,750	66,250	73.5%
材料 100 B材(電気資材)	0001 東東電材株式会社	280,000	220,000	155,353	64,647	70.6%
材料 100 B材(電気資材)	0002 本丸電材株式会社	0	0	27,300	-27,300	
【1計】		280,000	220,000	182,653	37,347	83.0%
材料 210 各種盤類	0001 東東電材株式会社	370,000	370,000	401,260	-31,260	108.4%
材料 215 照明器具類	0002 本丸電材株式会社	300,000	7,000	6,000	1,000	85.7%
【2計】		670,000	377,000	407,260	-30,260	108.0%
材料 305 空調機器類	0001 東東電材株式会社	210,000	100,000	76,800	23,200	76.8%
【3計】		210,000	100,000	76,800	23,200	76.8%
外注 500 はつり・土工費	0002 有限会社中田土木	300,000	100,000	80,000	20,000	80.0%
外注 510 保温・塗装・錆工事	0001 株式会社武富塗装工業	0	120,000	260,000	-140,000	216.7%
【5計】		300,000	220,000	340,000	-120,000	154.5%
経費 800 現場経費	0001 イワイ事務機	0	30,000	152,000	-122,000	506.7%
経費 805 旅費・交通費	0004 イシイ石油産業	0	70,000	60,000	10,000	85.7%
経費 830 重機レンタル費	0003 石峰リース	0	20,000	16,000	4,000	80.0%
【8計】		0	120,000	228,000	-108,000	190.0%

工 事 台 帳 (分類名別)

2003年 1月18日 00000001 1頁

抜出内訳日：

完成日：2002年 4月 1日 ~ 2002年12月31日

工事番号	00000001	支店	01	電気工事部
工事名称	(仮称)コーポ井上新築電気設備工事			
工事区分1	01	建築下請		
工事区分2	01	新築		
担当	01	山田		
受注先	0001	いろはに電気設備工業株式会社		
受注先担当者				
工事場所	××市××町1-1-1			
契約条件	別途打合せによる			
設計事務所	設計			

着工日	2002/08/01	完成予定日	2002/11/10
完成日	2002/11/30	作成日	2002/08/01

	契約日	契約額	消費税	契約額(税込)
初回契約	2002/08/01	1,000,000	50,000	1,050,000
追加契約1	2002/10/01	450,000	22,500	472,500
追加契約2		0	0	0
追加契約3		0	0	0
合計金額		1,450,000	72,500	1,522,500

	実行予算	工事原価	消化率
材料費	697,000	666,713	95.7%
労務費	250,000	183,750	73.5%
外注費	220,000	340,000	154.5%
経費	120,000	228,000	190.0%
合計	1,287,000	1,418,463	110.2%

(%)	金額	
一般管理費	8.0	116,000
予定利益	3.2	47,000
純利益	-5.8	84,463

分類名	実行予算額	実行額	累計額	差引額	%
(分類なし)	250,000	183,750	183,750	66,250	73.5%
【計】	250,000	183,750	183,750	66,250	73.5%
100 B材(電気資材)	220,000	182,653	182,653	37,347	83.0%
【1計】	220,000	182,653	182,653	37,347	83.0%
210 各種盤類	370,000	401,260	401,260	31,260	108.4%
215 照明器具類	7,000	6,000	6,000	1,000	85.7%
【2計】	377,000	407,260	407,260	30,260	108.0%
305 空調機器類	100,000	76,800	76,800	23,200	76.8%
【3計】	100,000	76,800	76,800	23,200	76.8%
500 はつり・土工費	100,000	80,000	80,000	20,000	80.0%
510 保温・塗装・錆工事	120,000	260,000	260,000	140,000	216.7%
【5計】	220,000	340,000	340,000	120,000	154.5%
800 現場経費	30,000	152,000	152,000	122,000	506.7%
805 旅費・交通費	70,000	60,000	60,000	10,000	85.7%
830 重機レンタル費	20,000	16,000	16,000	4,000	80.0%
【8計】	120,000	228,000	228,000	108,000	190.0%
【総合計】	1,287,000	1,418,463	1,418,463	131,463	110.2%

00000001

工 事 台 帳 (明 細)

2003年 1月18日 00000001 1頁

抜出内訳日： 2002年 4月 1日 ~ 2002年12月31日

完成日： 2002年 4月 1日 ~ 2002年12月31日

工事番号	00000001	支店	01	電気工事部
工事名称	(仮称)コーポ井上新築電気設備工事			
工事区分1	01	建築下請		
工事区分2	01	新築		
担当	01	山田		
受注先	0001	いろはに電気設備工業株式会社		
受注先担当者				
工事場所	××市××町1-1-1			
契約条件	別途打合せによる			
設計事務所	設計			
着工日	2002/08/01	完成予定日	2002/11/10	
完成日	2002/11/30	作成日	2002/08/01	
最終請求日	2002/12/30	請求合計額	1,522,500	
最終入金日	2003/01/31	入金合計額	1,522,500	

	契約日	契約額	消費税	契約額(税込)
初回契約	2002/08/01	1,000,000	50,000	1,050,000
追加契約1	2002/10/01	450,000	22,500	472,500
追加契約2		0	0	0
追加契約3		0	0	0
合計金額		1,450,000	72,500	1,522,500

	実行予算	工事原価	消化率
材料費	697,000	666,713	95.7%
労務費	250,000	183,750	73.5%
外注費	220,000	340,000	154.5%
経費	120,000	228,000	190.0%
合計	1,287,000	1,418,463	110.2%

	(%)	金額
一般管理費	8.0	116,000
予定利益	3.2	47,000
純利益	-5.8	84,463

日付	品名	規格	数量	単価	金額	分類	取引先	備考1
2002年10月30日	迄の繰越し	(材料)			510,373			
		(労務)			183,750			
		(外注)			220,000			
		(経費)			151,000			
11月02日	誘導灯 片面型	FL-10W	6.00	台	1,000.00	仕	215 本丸電材株式会社	
11月02日	レンタル		3.50	式	5,500.00	経	800 イワイ事務機	
11月02日	塗装費		2.00	式	10,000.00	外	510 株式会社武富塗装工業	
11月02日	ねじなし電線管	EP-31	10.00	本	760.00	仕	100 東東電材株式会社	1 単価?
11月03日	OC 電線	OC 22°	10.00	m	305.00	仕	100 東東電材株式会社	
11月03日	金属ダクトジャンクションボックス	亜鉛 50x70用 二方出 <DB7S	5.00	個	2,140.00	仕	100 東東電材株式会社	
11月03日	P.BOX (露出型焼付塗装付)	PB 300x300x200	5.00	面	18,700.00	仕	210 東東電材株式会社	
11月03日	6KV-CVTケーブル	6KV-CVT 22°	1.00	m	3,000.00	仕	100 東東電材株式会社	
11月03日	端末引締碍子フィードインキャップ	1P30・60・150A	5.00	個	3,370.00	仕	100 東東電材株式会社	
11月03日	スイッチボックス	SB-6 C付	1.00	個	3,040.00	仕	100 東東電材株式会社	
11月03日	和壁ボックス	鉄製 1個用	10.00	個	60.00	仕	100 東東電材株式会社	

工事台帳 (月別分類集計)

工事番号	00000001	支店	01	電気工部
工事名称	(仮称)コーポ井上新築電気設備工事			
工事区分1	01	建築下請		
工事区分2	01	新築		
担当	01	山田		
受注先	0001	いろはに電気設備工業株式会社		
受注先担当者				
工事場所	××市××町1-1-1			
契約条件	別途打合せによる			
設計事務所	〇〇〇設計			
着工日	2002/08/01	完成予定日	2002/11/10	
完成日	2002/11/30	作成日	2002/08/01	
最終請求日	2002/12/30	請求合計額	1,522,500	
最終入金日	2003/01/31	入金合計額	1,522,500	

	契約日	契約額	消費税	契約額(税込)
初回契約	2002/08/01	1,000,000	50,000	1,050,000
追加契約1	2002/10/01	450,000	22,500	472,500
追加契約2		0	0	0
追加契約3		0	0	0
合計金額		1,450,000	72,500	1,522,500

	見積原価額	実行予算	工事原価	差額	消化率
材料費	1,160,000	697,000	666,713	30,287	95.7%
労務費	390,000	250,000	183,750	66,250	73.5%
外注費	300,000	220,000	340,000	▲120,000	154.5%
経費	0	120,000	228,000	▲108,000	190.0%
合計	1,850,000	1,287,000	1,418,463	▲131,463	110.2%

	(%)	金額
一般管理費	8.0	116,000
予定利益	3.2	47,000
純利益	-5.8	▲84,463

分類	仕入先/外注先	実行予算	繰越実行額	2002年 7月	2002年 8月	2002年 9月	2002年 10月	2002年 11月	2002年 12月	実行額計	差額	消化率
材料 100 B材(電気資材)	0001 東東電材株式会社	220,000	0	0	44,680	14,373	44,260	52,040	0	155,353	64,647	70.6%
材料 100 B材(電気資材)	0002 本丸電材株式会社	0	0	0	15,458	9,292	2,550	0	0	27,300	▲27,300	
材料 210 各種盤類	0001 東東電材株式会社	370,000	0	0	31,800	6,160	265,000	98,300	0	401,260	▲31,260	108.4%
材料 215 照明器具類	0002 本丸電材株式会社	7,000	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000	1,000	85.7%
材料 305 空調機器類	0001 東東電材株式会社	100,000	0	0	76,800	0	0	0	0	76,800	23,200	76.8%
外注 500 はつり・土工費	0002 有限会社中田土木	100,000	0	0	0	20,000	60,000	0	0	80,000	20,000	80.0%
外注 510 保温・塗装・錆工事	0001 株式会社武富塗装工業	120,000	0	0	80,000	20,000	40,000	20,000	20,000	180,000	▲60,000	150.0%
労務		250,000	0	0	80,500	28,250	75,000	0	0	183,750	66,250	73.5%
経費 800 現場経費	0001 イワイ事務機	30,000	0	0	47,500	11,000	16,500	19,250	22,000	116,250	▲86,250	387.5%
経費 805 旅費・交通費	0004 イシイ石油産業	70,000	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	10,000	85.7%
経費 830 重機レンタル費	0003 石峰リース	20,000	0	0	0	16,000	0	0	0	16,000	4,000	80.0%
	【合計】	1,287,000	0	0	436,738	125,075	503,310	195,590	42,000	1,302,713	▲15,713	101.2%

工 事 台 帳 (材料集計)

2003年 1月18日 00000001 1頁

抜出内訳日： 2002年 4月 1日 ~ 2002年12月31日

完成日： 2002年 4月 1日 ~ 2002年12月31日

工事番号	00000001	支店	01	電気工事部
工事名称	(仮称)コーポ井上新築電気設備工事			
工事区分1	01	建築下請		
工事区分2	01	新築		
担当	01	山田		
受注先	0001	いろはに電気設備工業株式会社		
受注先担当者				
工事場所	××市××町1-1-1			
契約条件	別途打合せによる			
設計事務所	設計			
着工日	2002/08/01	完成予定日	2002/11/10	
完成日	2002/11/30	作成日	2002/08/01	
最終請求日	2002/12/30	請求合計額	1,522,500	
最終入金日	2003/01/31	入金合計額	1,522,500	

	契約日	契約額	消費税	契約額(税込)
初回契約	2002/08/01	1,000,000	50,000	1,050,000
追加契約1	2002/10/01	450,000	22,500	472,500
追加契約2		0	0	0
追加契約3		0	0	0
合計金額		1,450,000	72,500	1,522,500

	実行予算	工事原価	消化率
材料費	697,000	666,713	95.7%
労務費	250,000	183,750	73.5%
外注費	220,000	340,000	154.5%
経費	120,000	228,000	190.0%
合計	1,287,000	1,418,463	110.2%

	(%)	金額
一般管理費	8.0	116,000
予定利益	3.2	47,000
純利益	-5.8	84,463

品名	規格	数量	単価	金額	分類
6KV-CVTケーブル	6KV-CVT 22°	1.00 m	3,000.00	3,000	材料 100 B材(電気資材)
OC電線	OC 22°	10.00 m	305.00	3,050	材料 100 B材(電気資材)
P.BOX (露出型焼付塗装付)	PB 150x150x100	3.00 面	10,600.00	31,800	材料 210 各種盤類
P.BOX (露出型焼付塗装付)	PB 300x300x200	5.00 面	18,700.00	93,500	材料 210 各種盤類
P.BOX-U (蓋無し埋込型)	PB-U 100x100x100	10.00 面	7,500.00	75,000	材料 210 各種盤類
P.BOX-W (水切防水型塗装付)	PB-W 150x150x100	10.00 面	19,000.00	190,000	材料 210 各種盤類
スイッチボックス	SB-2 C付	10.00 個	380.00	3,800	材料 100 B材(電気資材)
スイッチボックス	SB-6 C付	1.00 個	3,040.00	3,040	材料 100 B材(電気資材)
ねじなし電線管	EP-31	11.00 本	760.00	8,360	材料 100 B材(電気資材)
ねじなし電線管	EP-31	80.00 m	183.00	14,640	材料 100 B材(電気資材)
ねじなし電線管	EP-31	4.00 本	712.00	2,848	材料 100 B材(電気資材)
ねじなし電線管	EP-51	10.00 本	1,270.00	12,700	材料 100 B材(電気資材)
ねじなし電線管	EP-75	4.00 本	2,180.00	8,720	材料 100 B材(電気資材)
ねじなし電線管	EP-63	10.00 本	1,650.00	16,500	材料 100 B材(電気資材)
プルボックス	PB 100x100x100	10.00 面	480.00	4,800	材料 210 各種盤類

工 事 台 帳 (分類別明細)

2003年 1月18日 00000001 1頁

抜出内訳日：2002年 4月 1日～2002年12月31日

完成日：2002年 4月 1日～2002年12月31日

工事番号	00000001	支店	01	電気工事部
工事名称	(仮称)コーポ井上新築電気設備工事			
工事区分1	01	建築下請		
工事区分2	01	新築		
担当	01	山田		
受注先	0001	いろはに電気設備工業株式会社		
受注先担当者				
工事場所	××市××町1-1-1			
契約条件	別途打合せによる			
設計事務所	設計			
着工日	2002/08/01	完成予定日	2002/11/10	
完成日	2002/11/30	作成日	2002/08/01	
最終請求日	2002/12/30	請求合計額	1,522,500	
最終入金日	2003/01/31	入金合計額	1,522,500	

	契約日	契約額	消費税	契約額(税込)
初回契約	2002/08/01	1,000,000	50,000	1,050,000
追加契約1	2002/10/01	450,000	22,500	472,500
追加契約2		0	0	0
追加契約3		0	0	0
合計金額		1,450,000	72,500	1,522,500

	実行予算	工事原価	消化率
材料費	697,000	666,713	95.7%
労務費	250,000	183,750	73.5%
外注費	220,000	340,000	154.5%
経費	120,000	228,000	190.0%
合計	1,287,000	1,418,463	110.2%

	(%)	金額
一般管理費	8.0	116,000
予定利益	3.2	47,000
純利益	-5.8	84,463

日付	品名	規格	数量	単価	金額	分類	取引先	備考1
2002年10月30日	迄の繰越し	(材料)			510,373			
		(労務)			183,750			
		(外注)			220,000			
		(経費)			151,000			
11月02日	ねじなし電線管	EP-31	10.00	本	760.00	仕100	東東電材株式会社	1 単価?
11月03日	端末引締碍子フィードインキャップ	1P30・60・150A	5.00	個	3,370.00	仕100	東東電材株式会社	
11月03日	6KV-CVTケーブル	6KV-CVT 22°	1.00	m	3,000.00	仕100	東東電材株式会社	
11月03日	OC電線	OC 22°	10.00	m	305.00	仕100	東東電材株式会社	
11月03日	金属ダクトジャンクションボックス	垂鉛 50x70用 二方出 <DB7S	5.00	個	2,140.00	仕100	東東電材株式会社	
11月03日	和壁ボックス	鉄製 1個用	10.00	個	60.00	仕100	東東電材株式会社	
11月03日	スイッチボックス	SB-6 C付	1.00	個	3,040.00	仕100	東東電材株式会社	
11月03日	継ぎ金具 H70	<SR>メッキ焼付 H70 <SRG1x2	10.00	組	720.00	仕100	東東電材株式会社	
	【分類計】	B材(電気資材)			52,040			
11月03日	P.BOX (露出型焼付塗装付)	PB 300x300x200	5.00	面	18,700.00	仕210	東東電材株式会社	
11月03日	プルボックス	PB 100x100x100	10.00	面	480.00	仕210	東東電材株式会社	

工 事 台 帳 (業 者 別 明 細)

2003年 1月18日 00000001 1頁

抜出内訳日：2002年 4月 1日～2002年12月31日

完成日：2002年 4月 1日～2002年12月31日

工事番号	00000001	支店	01	電気工事部
工事名称	(仮称)コーポ井上新築電気設備工事			
工事区分1	01	建築下請		
工事区分2	01	新築		
担当	01	山田		
受注先	0001	いろはに電気設備工業株式会社		
受注先担当者				
工事場所	××市××町1-1-1			
契約条件	別途打合せによる			
設計事務所	設計			
着工日	2002/08/01	完成予定日	2002/11/10	
完成日	2002/11/30	作成日	2002/08/01	
最終請求日	2002/12/30	請求合計額	1,522,500	
最終入金日	2003/01/31	入金合計額	1,522,500	

	契約日	契約額	消費税	契約額(税込)
初回契約	2002/08/01	1,000,000	50,000	1,050,000
追加契約1	2002/10/01	450,000	22,500	472,500
追加契約2		0	0	0
追加契約3		0	0	0
合計金額		1,450,000	72,500	1,522,500

	実行予算	工事原価	消化率
材料費	697,000	666,713	95.7%
労務費	250,000	183,750	73.5%
外注費	220,000	340,000	154.5%
経費	120,000	228,000	190.0%
合計	1,287,000	1,418,463	110.2%

	(%)	金額
一般管理費	8.0	116,000
予定利益	3.2	47,000
純利益	-5.8	84,463

日付	品名	規格	数量	単価	金額	分類	取引先	備考1
2002年10月30日	迄の繰越し	(材料)			510,373			
		(労務)			183,750			
		(外注)			220,000			
		(経費)			151,000			
11月02日	ねじなし電線管	EP-31	10.00	本	760.00	仕100	東東電材株式会社	1 単価?
11月03日	0C電線	0C 22°	10.00	m	305.00	仕100	東東電材株式会社	
11月03日	金属ダクトジャンクションボックス	亜鉛 50x70用 二方出 <DB7S	5.00	個	2,140.00	仕100	東東電材株式会社	
11月03日	P.BOX (露出型焼付塗装付)	PB 300x300x200	5.00	面	18,700.00	仕210	東東電材株式会社	
11月03日	6KV-CVTケーブル	6KV-CVT 22°	1.00	m	3,000.00	仕100	東東電材株式会社	
11月03日	端末引締碍子フィードインキャップ	1P30・60・150A	5.00	個	3,370.00	仕100	東東電材株式会社	
11月03日	スイッチボックス	SB-6 C付	1.00	個	3,040.00	仕100	東東電材株式会社	
11月03日	和壁ボックス	鉄製 1個用	10.00	個	60.00	仕100	東東電材株式会社	
11月03日	プルボックス	PB 100x100x100	10.00	面	480.00	仕210	東東電材株式会社	
11月03日	継ぎ金具 H70	<SR> 焼付 H70 <SRG1x2	10.00	組	720.00	仕100	東東電材株式会社	
	【業者計】	東東電材株式会社			150,340			

仕 入 元 帳

2003年 1月20日 1頁

0001 東東電材株式会社

抜出内訳日：2002年 9月 1日～2002年 9月30日

日付	品名	規格	数量	単価	金額	工事名称	備考1	
2002/09/01	ねじなし電線管	EP-31	4.00	本	712.00	2,848	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	
2002/09/01	P.BOX -C (錆止め型)	PB-C 100x100x100	10.00	面	8,700.00	87,000	00000014 邸電気工事	
2002/09/01	漏電遮断器	ELCB 2P2E30AF	2.00	台	3,080.00	6,160	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	
2002/09/02	透明ジョイントボックス	大丸型	55.00	個	51.00	2,805	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	
2002/09/03	ねじなし電線管	EP-75	4.00	本	2,180.00	8,720	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	
2002/09/10	資材9月分		1.00		783,233.00	783,233	00000032 石田ビル新築電気設備工事	
2002/09/10	資材9月分		1.00		127,000.00	127,000	00000032 石田ビル新築電気設備工事	
2002/09/12	蛍光灯器具 V 型	FL-40Wx2 SA021A21	6.00	台	12,700.00	76,200	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	1 単価?
2002/09/12	誘導灯 室内通路	両面 FL-20W UT09765	5.00	台	7,600.00	38,000	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	
2002/09/12	ダウンライト 丸型	FML-13W FX3212	7.00	台	10,700.00	74,900	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	
2002/09/12	照明器具	DS-65431R	2.00	台	21,900.00	43,800	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	1 単価?
2002/09/12	照明器具	DS-75RFYT	1.00	台	3,200.00	3,200	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	1 単価?
2002/09/12	照明器具	TR-7YRFF	1.00	台	6,500.00	6,500	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	1 単価?
2002/09/12	照明器具	87376EWA	21.00	台	543.00	11,403	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	2 工事?
2002/09/12	照明器具	YRYTR-76	6.00	台	76.00	456	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	2 工事?
2002/09/12	照明器具	DS-65RE	2.00	台	3,290.00	6,580	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	
2002/09/20	アウトレットボックス	OB 102x44 2 C付 <中浅	10.00	個	223.00	2,230	00000014 邸電気工事	
2002/09/21	IV 電線	IV 1.0mm	100.00	m	8.00	800	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
2002/09/21	6KV-CV ケーブル	6KV-CV 22° -3C	1.00	m	1,248.00	1,248	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
2002/09/21	アウトレットボックス	OB 102x44 1 C付 <中浅	1.00	個	199.00	199	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
2002/09/21	EM-IC 電線 <HIV	IC 8°	1.00	m	10,000.00	10,000	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
2002/09/21	集電アームセタリ付	1P30A リド5.5°	1.00	個	6,620.00	6,620	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
2002/09/21	ファクトライン 30	ジョイント L	10.00	個	7,060.00	70,600	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
2002/09/21	6KV-CVT ケーブル	6KV-CVT 60°	1.00	m	2,138.00	2,138	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
2002/09/21	鋼製ノーマルバンド	EP-31	1.00	本	365.00	365	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
2002/09/21	セタリフィードインジョイント	1P200A用	1.00	個	3,890.00	3,890	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
		【 合計 】				1,376,895		

仕入先別工事一覧表

2003年 1月20日 1頁

抜出内訳日：2002年 9月 1日～2002年 9月30日

取引先		仕入金額	工事名称	担当者
0001	東東電材株式会社	20,533	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	山田
		261,039	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	山田
		89,230	00000014 邸電気工事	飯田
		95,860	00000015 A A A マンション水漏れ工事	岡島
		910,233	00000032 石田ビル新築電気設備工事	山田
	【業者計】	1,376,895		
0002	本丸電材株式会社	9,292	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	山田
		30,600	00000009 (仮称)Aマンション新築電気設備	飯田
		323,303	00000032 石田ビル新築電気設備工事	山田
	【業者計】	363,195		
0005	商会株式会社	1,830	00000005 橋本邸改修工事	浜崎
	【業者計】	1,830		
0006	ABCD機材有限会社	5,100	00000005 橋本邸改修工事	浜崎
	【業者計】	5,100		
0008	株式会社 森田	450,000	00000005 橋本邸改修工事	浜崎
		23,000	00000006 沢田邸新築電気設備工事	浜崎
	【業者計】	473,000		
0011	株式会社 北白川管材	310,570	00000011 大上ビル新築工事 (電気・空調・衛生設備)	岡島
	【業者計】	310,570		
0012	株式会社 岸田工業	310,570	00000012 湯浅邸新築電気設備工事	山田
	【業者計】	310,570		
	【合計】	2,841,160		

経費取引先別工事一覧表

2003年 1月20日 1頁

抜出内訳日：2002年 8月 1日～2002年 8月31日

取引先	仕入金額	工事名称	担当者
0001 イワイ事務機	47,500	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	山田
	87,000	00000003 森本邸新築電気設備工事	飯田
	68,000	00000004 山本邸改修工事	山田
	2,000	00000006 沢田邸新築電気設備工事	浜崎
【業者計】	50,000	00000015 A A A マンション水漏れ工事	岡島
	254,500		
0003 石峰リース	45,000	00000032 石田ビル新築電気設備工事	山田
【業者計】	45,000		
0004 イシイ石油産業	60,000	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	山田
	40,000	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	山田
	3,000	00000016 A B C 印刷株式会社 広島工場新築電気設備工事	山田
	150,000	00000034 加田道ショーウルーム改装設備工事	飯田
【業者計】	253,000		
0005 広川リース	1,230,132	00000033 五月邸新築電気設備工事	山田
【業者計】	1,230,132		
【合計】	1,782,632		

労務費工事一覧表（工事/担当者）

2003年 1月20日 1頁

抜出内訳日：2002年 9月 1日～2002年 9月30日

工事名称	名称	数量	単価	金額
00000001 (仮称) コーポ井上新築電気設備工事	佐野	通常 1.00 時間	2,000.00	2,000
	山上	残業 5.00 時間	2,000.00	10,000
	山上	通常 11.00 時間	1,000.00	11,000
	中本	通常 3.50 時間	1,500.00	5,250
		【合計】		28,250
00000002 DEMOビル新築電気設備工事	佐野	通常 4.00 時間	2,000.00	8,000
	山上	通常 7.00 時間	1,000.00	7,000
	中本	残業 7.00 時間	3,000.00	21,000
	中本	通常 44.00 時間	1,500.00	66,000
		【合計】		102,000
00000005 橋本邸改修工事	中本	通常 1.00 時間	1,500.00	1,500
		【合計】		1,500
		【総合計】		131,750

労務費工事一覧表（担当者/工事）

2003年 1月20日 1頁

抜出内訳日：2002年 9月 1日～2002年 9月30日

名 称		工 事 名 称	数 量	単 価	金 額
佐野	通常	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	1.00 時間	2,000.00	2,000
	通常	00000002 DEMO社 [®] 新築電気設備工事	4.00 時間	2,000.00	8,000
		【 合 計 】	5.00		10,000
山上	残業	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	5.00 時間	2,000.00	10,000
	通常	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	11.00 時間	1,000.00	11,000
	通常	00000002 DEMO社 [®] 新築電気設備工事	7.00 時間	1,000.00	7,000
		【 合 計 】	23.00		28,000
中本	残業	00000002 DEMO社 [®] 新築電気設備工事	7.00 時間	3,000.00	21,000
	通常	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	3.50 時間	1,500.00	5,250
	通常	00000002 DEMO社 [®] 新築電気設備工事	44.00 時間	1,500.00	66,000
	通常	00000005 橋本邸改修工事	1.00 時間	1,500.00	1,500
		【 合 計 】	55.50		93,750
		【 総合計 】	83.50		131,750

在庫一覧表

品名コード 規格コード 品名 規格名

品名		規格	棚番	仕入先	分類	単位	単価	在庫数	実数	金額
01320	001	樹脂製ノーマルベンド	VE-16	株式会社		本	65.00	5.00		325
02850	311	露出 鋼製 角型 ボックス	1竹用 CP-19 1方出	有限会社		個	430.00	10.00		4,300
04010	001	P.BOX -C (錆止め型)	PB-C 100x100x100	有限会社		面	8,700.00	5.00		43,500
05100	103	直線ケ - ブラック H70 <SR	メミン焼付 H=70 W=300 <SR30	株式会社		m	2,033.00	10.00		20,330
05100	103	直線ケ - ブラック H70 <SR	メミン焼付 H=70 W=300 <SR30	株式会社		m	2,033.00	10.00		20,330
05100	202	直線ケ - ブラック H70 <SR	S U S H=70 W=200 <S-SR20	有限会社		本	19,500.00	1.00		19,500
05146	110	水平自在継ぎ金具 H70 <SR	メミン焼付 <SRBG1	有限会社		組	1,300.00	10.00		13,000
07210	010	レ - スウェイエルボ	亜鉛蓋付 立面内曲 30x40	有限会社		個	665.00	10.00		6,650
09100	010	金属ダクトエンドキャップ	亜鉛メッキ 30x60用 <EC3	株式会社		個	64.00	50.00		3,200
09270	010	金属ダクトコネクタプレート	亜鉛メッキ 大角型 1個用	有限会社		個	130.00	10.00		1,300
11030	001	1種金属線ぴかアップリング	MM-A	株式会社		個	65.00	100.00		6,500
14010	002	フロアーダクト	F-5	株式会社		m	834.00	10.00		8,340
21065	005	OC 電 線	OC 5mm	株式会社		m	235.00	100.00		23,500
56010	001	集合インターホン設備機器		有限会社		台	1,000.00	9.00		9,000
56010	001	集合インターホン設備機器			弱電機器類	台	1,000.00	-5.00		-5,000
56020	002	ロビ - インタ - ホン	テレビカメラ付	有限会社		台	15,000.00	9.00		135,000
56030	001	集合インターホン制御装置		有限会社		台	10,000.00	10.00		100,000
			【 在庫金額合計 】							409,775

在庫マスタリスト

品名コード 規格コード 品名 規格名

コード	品名	規格名			分類名称	仕入先	最終在庫日	最終出庫日	棚番
		安全在庫	在庫数	在庫金額					
0132001	樹脂製ノーマルバンド		VE-16			株式会社 トク・ビ・シー	2002/08/03		
		2.00	5.00	325	65.00	70.00		1.00	70
0285011	露出 銅製 角型 ボックス		1方用 CP-19 1方出			有限会社 福島工業	2002/08/04		
			10.00	4,300	430.00				
0401001	P.BOX -C (錆止め型)		PB-C 100x100x100			有限会社 福島工業	2002/08/05		
			5.00	43,500	8,700.00				
05100103	直線ケ - ブルック H70 <SR		タリ焼付 H=70 W=300 <SR30			株式会社 トク・ビ・シー	2002/08/01		
			10.00	20,330	2,033.00				
05100103	直線ケ - ブルック H70 <SR		タリ焼付 H=70 W=300 <SR30			株式会社 トク・ビ・シー	2002/08/01		
			10.00	20,330	2,033.00				
05100202	直線ケ - ブルック H70 <SR		S U S H=70 W=200 <S- SR20			有限会社 福島工業	2002/08/05		
			1.00	19,500	19,500.00				
05146110	水平自在継ぎ金具 H70 <SR		タリ焼付 <SRBG1			有限会社 福島工業	2002/08/05		
			10.00	13,000	1,300.00				
07210010	レ - スウェイエルボ		垂鉛蓋付 立面内曲 30x40			有限会社 福島工業	2002/08/04		
			10.00	6,650	665.00				
09100010	金属ダクトエンドキャップ		垂鉛メッキ 30x60用 <EC3			株式会社 トク・ビ・シー	2002/08/02		
			50.00	3,200	64.00				
09270010	金属ダクトコンソルトプレート		垂鉛メッキ 大角型 1個用			有限会社 福島工業	2002/08/04		
			10.00	1,300	130.00				
11030001	1種金属線び加ブリング		MM-A			株式会社 トク・ビ・シー	2002/08/02		
			100.00	6,500	65.00				
14010002	フロアダクト		F-5			株式会社 トク・ビ・シー	2002/08/01		
			10.00	8,340	834.00				
21065005	OC 電 線		OC 5mm			株式会社 トク・ビ・シー	2002/08/01		
			100.00	23,500	235.00				
56010001	集合インタ-ル設備機器					有限会社 林電材	2002/08/04	2002/08/05	
			9.00	9,000	1,000.00				
56010001	集合インタ-ル設備機器					弱電機器類			2002/08/04
			-5.00	-5,000	1,000.00				
56020002	ロビ - インタ - ホン		テレビカメラ付			有限会社 林電材	2002/08/04	2002/08/05	
			9.00	135,000	15,000.00				
56030001	集合インタ-ル制御装置					有限会社 林電材	2002/08/04		
			10.00	100,000	10,000.00				

在庫更新リスト


2003年 1月20日 1 頁

在庫設定基準：品名 規格 単価 分類 単位


日付 2003/ 1/20 現在

品名			規格	単位	仕入先	分類	締切数量	締切金額	入庫数	出庫数	在庫数	単価	金額
11030	001	1種金属線びっアップリング	MM-A	個	株式会社 トクダ		100.00	6,500	100.00	0.00	200.00	65.00	13,000
21065	005	OC電線	OC 5mm	m	株式会社 トクダ		100.00	23,500	100.00	0.00	200.00	235.00	47,000
04010	001	P.BOX -C (錆止め型)	PB-C 100x100x100	面	有限会社 福島		5.00	43,500	5.00	0.00	10.00	8,700.00	87,000
14010	002	フローダクト	F-5	m	株式会社 トクダ		10.00	8,340	10.00	0.00	20.00	834.00	16,680
07210	010	レースウェイエルボ	亜鉛蓋付 立面内曲 30x40	個	有限会社 福島		10.00	6,650	10.00	0.00	20.00	665.00	13,300
56020	002	ロビーインターホン	テレビカメラ付	台	有限会社 林電		9.00	135,000	10.00	1.00	18.00	15,000.00	270,000
09100	010	金属ダクトエンドキャップ	亜鉛メッキ 30x60用 <EC3	個	株式会社 トクダ		50.00	3,200	50.00	0.00	100.00	64.00	6,400
09270	010	金属ダクトコンセントプレート	亜鉛メッキ 大角型 1個用	個	有限会社 福島		10.00	1,300	10.00	0.00	20.00	130.00	2,600
01320	001	樹脂製ノーマルバンド	VE-16	本	株式会社 トクダ		5.00	325	5.00	0.00	10.00	65.00	650
56030	001	集合インターホン制御装置		台	有限会社 林電		10.00	100,000	10.00	0.00	20.00	10,000.00	200,000
56010	001	集合インターホン設備機器		台	有限会社 林電		9.00	9,000	10.00	6.00	13.00	1,000.00	13,000
56010	001	集合インターホン設備機器		台		弱電機器類	-5.00	-5,000	0.00	5.00	-10.00	1,000.00	-10,000
05146	110	水平自在継ぎ金具 H70 <SR	メッキ焼付 <SRBG1	組	有限会社 福島		10.00	13,000	10.00	0.00	20.00	1,300.00	26,000
05100	202	直線ケーブルラック H70 <SR	SUS H=70 W=200 <S-SR20	本	有限会社 福島		1.00	19,500	1.00	0.00	2.00	19,500.00	39,000
05100	103	直線ケーブルラック H70 <SR	メッキ焼付 H=70 W=300 <SR30	m	株式会社 トクダ		10.00	20,330	10.00	0.00	20.00	2,033.00	40,660
05100	103	直線ケーブルラック H70 <SR	メッキ焼付 H=70 W=300 <SR30	m	株式会社 トクダ		10.00	20,330	10.00	0.00	20.00	2,033.00	40,660
02850	311	露出 鋼製 角型 ボックス	1ヶ用 CP-19 1方出	個	有限会社 福島		10.00	4,300	10.00	0.00	20.00	430.00	8,600
【 在庫金額合計 】													814,550

支払処理 (P)

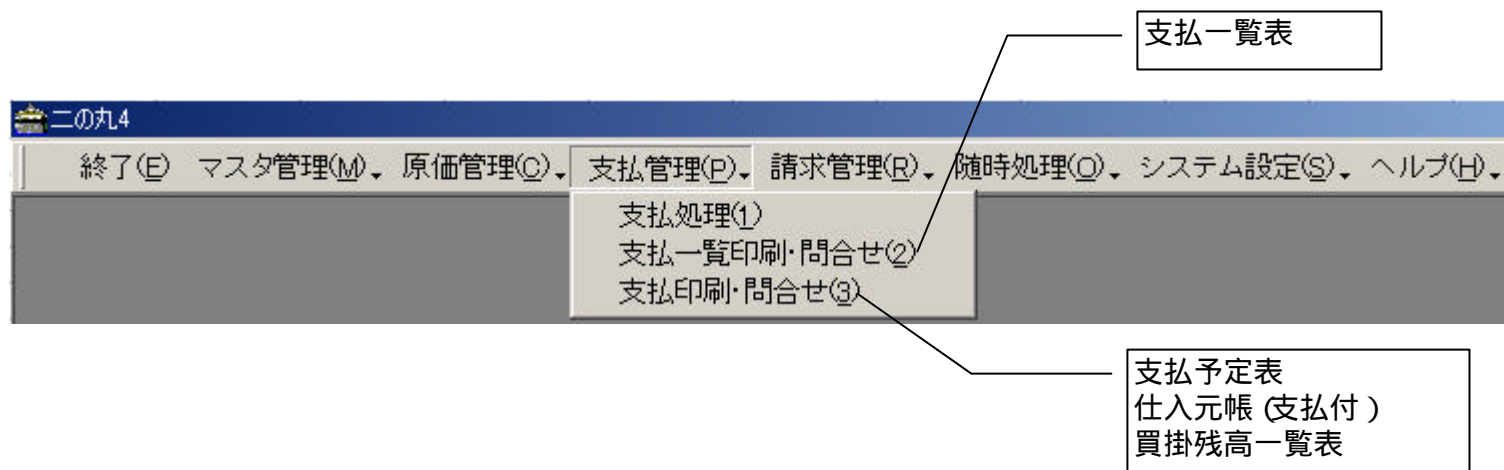

マスタ管理 (M)

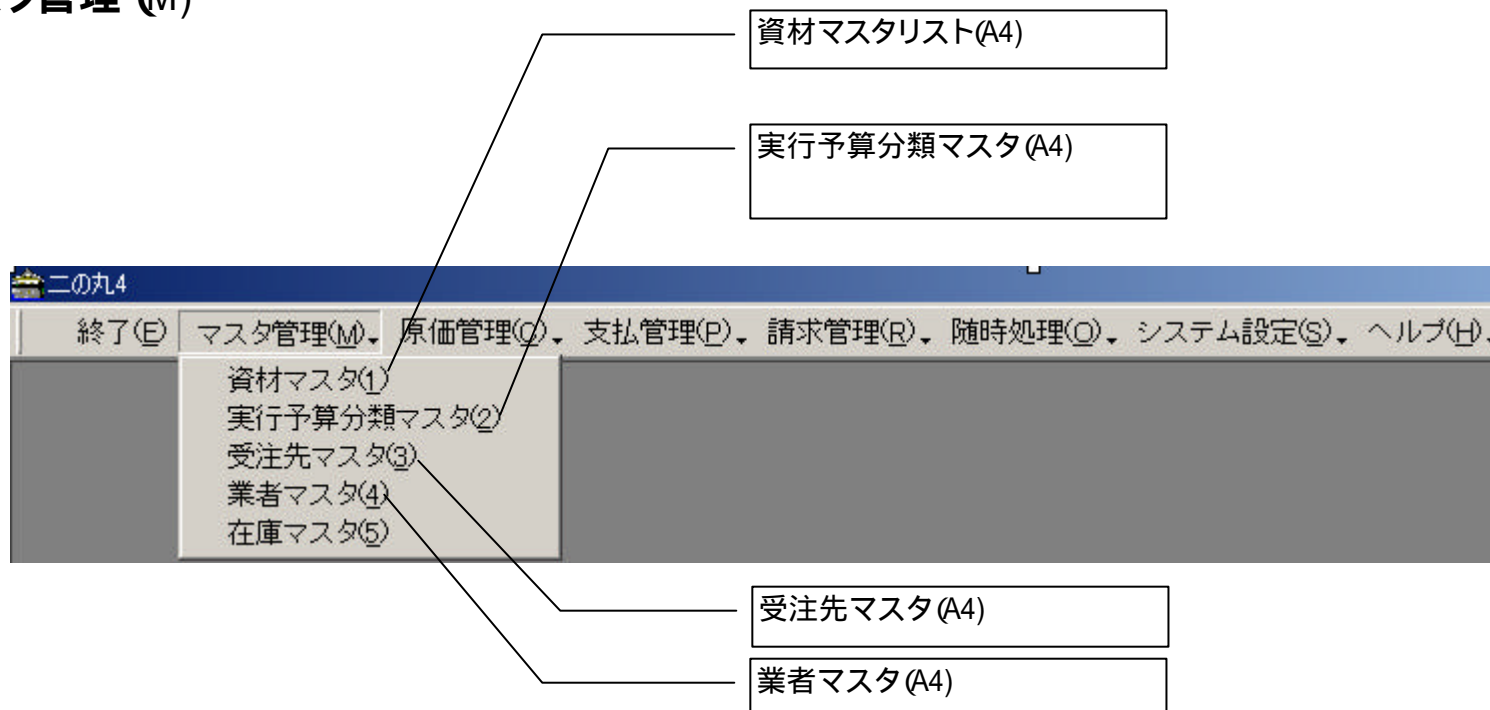

区分： 材料

資材マスタリスト

コード	品名	規格名	原価	定価	売価1	分類名称			仕入先	最終利用
						売価2	売価3	売価4		
01004004	薄鋼電線管	CP-39 m	242.00	0.00	0.00			東東電材株式会社	2002/09/24	
01004005	薄鋼電線管	CP-51 m	355.00	0.00	0.00			東東電材株式会社	2002/08/07	
01004006	薄鋼電線管	CP-63 m	541.00	0.00	0.00			東東電材株式会社	2002/09/24	
01004007	薄鋼電線管	CP-75 m	665.00	0.00	0.00			東東電材株式会社	2002/09/24	
01006001	厚鋼電線管	GP-16 m	177.00	0.00	0.00			東東電材株式会社	2002/09/24	
01006002	厚鋼電線管	GP-22 m	227.00	0.00	0.00			東東電材株式会社	2002/08/07	
01006003	厚鋼電線管	GP-28 m	312.00	0.00	0.00			東東電材株式会社	2002/08/07	
01006004	厚鋼電線管	GP-36 m	398.00	0.00	0.00			東東電材株式会社	2002/08/07	
01006005	厚鋼電線管	GP-42 m	461.00	0.00	0.00			東東電材株式会社	2002/08/07	
01008001	ライニング鋼管	PE-16 m	352.00	0.00	0.00			株式会社 北白川管材	2002/08/13	
01008002	ライニング鋼管	PE-22 m	400.00	0.00	0.00			株式会社 北白川管材	2002/08/13	
01008003	ライニング鋼管	PE-28 m	514.00	0.00	0.00			株式会社 北白川管材	2002/08/13	
01008004	ライニング鋼管	PE-36 m	660.00	0.00	0.00			株式会社 北白川管材	2002/08/13	
01009002	ねじなしホリゾンタル鋼管	PE-E 16 m	361.00	0.00	0.00			株式会社 北白川管材	2002/09/24	
01009003	ねじなしホリゾンタル鋼管	PE-E 22 m	415.00	0.00	0.00			株式会社 北白川管材	2002/08/13	
01009004	ねじなしホリゾンタル鋼管	PE-E 28 m	525.00	0.00	0.00			株式会社 北白川管材	2002/08/13	
01009005	ねじなしホリゾンタル鋼管	PE-E 36 m	675.00	0.00	0.00			株式会社 北白川管材	2002/08/13	
01009006	ねじなしホリゾンタル鋼管	PE-E 42 m	760.00	0.00	0.00			株式会社 北白川管材	2002/08/13	

受注先マスターリスト

コード	社名	フリガナ 分類	TEL ランク	TEL 締日	FAX 合計請	FAX 税額計算	〒 住所1 税額端数	住所1 税単位	住所2 計算端数	住所2 入金区分	住所2 入金日	担当 売掛残
0001	いろはに電気設備工業株式会社	イロハ A	082-XXX-XXXX	A 31 Y	082-XXX-XXXX	伝票単位	7XX-XXXX 広島市中区堺町XX-X	切上げ 1円単位	切上げ	翌月	15	井上 50,000
0002	A B C 宮路商事株式会社	ミヤジ A	082-XXX-XXXX	A 31 Y	082-XXX-XXXX	締日単位	7XX-XXXX 広島市西区XX町	切上げ 1円単位	切上げ	翌月	15	岡田 100,000
0003	青田興業有限会社	アオタ B	082-001-0001	A 31 Y	082-001-0002	内税	730-0000 広島市中区紙屋町1-2-3	四捨五入 100円単位	四捨五入	2ヶ月	15	高田 150,000
0004	石田工務店	イシダ C	082-231-0002	B 31 Y	082-231-0010	非課税	730-1111 広島市中区大手町5号10番	四捨五入 100円単位	四捨五入	2ヶ月	15	黒石 2,000,000
0005	恵比寿建設工業株式会社	エビス A	082-221-5050	B 31 Y	082-221-5051	伝票単位	730-0000 広島市西区観音新町5丁目1-1	四捨五入 100円単位	四捨五入	2ヶ月	15	田村 200,000
0006	有限会社岡信興産	オガシ B	082-231-5754	B 31 Y	082-231-5755	伝票単位	730-0000 広島市西区大芝6丁目	四捨五入 100円単位	四捨五入	2ヶ月	15	村田 150,000
0007	有限会社川崎興産	カサキ D	082-255-5555	C 31 N	082-265-6666	伝票単位	733-2222 広島市西区 町	四捨五入 100円単位	四捨五入	翌月	20	植田 82,000
0008	池辺電設株式会社	イケノ A	083-333-3333	A 31 N	083-343-3535	伝票単位	733-3333 広島市中区XX町	切上げ 100円単位	四捨五入	翌月	20	上井 100,000
0009	竹内産業	タケノ A	055-555-5555	A 31 N	156-666-6666	伝票単位	733-2622 広島市中区紙屋町	切上げ 100円単位	四捨五入	翌月	20	川上 50,000
0011	商事有限会社	シノ A	066-666-6665	A 31 Y	044-252-6666	伝票単位	755-2626 広島市安芸区	切上げ 100円単位	四捨五入	翌月	20	植田 60,000
0012	中田株式会社	ナカダ A	088-989-5959	A 20 N	044-535-7897	伝票単位	555-6666 広島市西区三篠	切上げ 100円単位	四捨五入	翌月	20	大針 40,000
0013	宮川電気店	ミヤガワ A	056-878-9898	A 31 Y	056-777-8585	締日単位	733-5555 広島市西区 町	切上げ 100円単位	四捨五入	翌月	20	佐々木 100,000
0014	川辺電気店	カノヘ A	066-666-6666	A 31 Y		伝票単位	広島市西区 x x 町	切上げ 100円単位	四捨五入	翌月	20	橋本 50,000
0022	井上商会	イノウエ A		A 31 N		伝票単位		切上げ 100円単位	四捨五入	翌月	20	0
2222	合計請求書発行のための			A 31 Y		伝票単位		切上げ 100円単位	四捨五入	翌月	20	50,000
9999	その他一般	ソノタ A		A 31 N		伝票単位		切上げ 100円単位	四捨五入	翌月	20	32,000

区分：仕入先

業者マスタリスト

コード	社名	フリガナ 分類	TEL 締日	FAX 支払処理	〒 住所1	住所2	担当	計算端数	支払区分	支払日	支払残	支払先名
0001	東東電材株式会社	トウトウデンガイ Z	088-888-8888 31	088-888-8887 Y	773-3333 広島市西区紺屋町		石井	四捨五入	翌月	31	50,000	東東電材株式会社
0002	本丸電材株式会社	ホンマル Z	075-777-7777 31	075-777-7776 Y	777-4444 広島市中区元町		石村	切上げ	翌月	31	100,000	本丸電材株式会社
0003	二の丸鋼管株式会社	ニノマルコウカン Z	079-989-9898 31	079-898-8989 Y	777-5555 広島市安佐南区XX町		中村	切上げ	翌月	31	150,000	二の丸鋼管株式会社
0004	石田機材株式会社	イシダ X	065-656-9595 31	065-989-5959 Y	777-4565 広島市安佐北区	町	村山	切上げ	2ヶ月	31	0	石田機材株式会社
0005	商会株式会社	マル X	044-456-7898 20	048-898-9898 Y	777-8588 広島市安佐北区XX町		村田	切上げ	当月	31	0	商会株式会社
0006	ABCD機材有限会社	エービーシー X	066-565-8989 31	012-234-5678 Y	666-6666 府中市	町	酒井	切上げ	翌月	31	60,000	ABCD機材有限会社
0007	時田商事有限会社	トキダ Z	088-989-8888 31	088-999-7777 Y	555-8888 広島市安佐南区	町	井川	切上げ	翌月	31	0	時田商事有限会社
0008	株式会社 森田	モリタ X	055-555-5555 31	055-444-4445 Y	555-8887 広島市中区元町XX		武田	切上げ	翌月	31	0	株式会社 森田
0009	有限会社 林電材	ハヤシ X	088-999-2222 31	025-111-1111 Y	666-8888 広島市西区国泰寺		伊藤	切上げ	翌月	31	0	有限会社 林電材
0011	株式会社 北白川管材	キタシロカワ X	045-999-8989 31	075-555-8989 Y	666-9999 広島市安芸区XX町		川口	切上げ	翌月	31	50,000	株式会社 北白川管材
0012	株式会社 岸田工業	キタ X	088-595-4444 20	099-666-6868 Y	555-9898 広島市西区三篠		竹内	切上げ	2ヶ月	20	50,000	株式会社 岸田工業
0013	株式会社 トクダ・ビルマ	トクダ X		N				切上げ	翌月	31	0	株式会社 トクダ・ビルマ
0014	有限会社 福島工業	フクマ X		N				切上げ	翌月	31	0	有限会社 福島工業
0015	岡林商会 株式会社	オカバヤシ X		N				切上げ	翌月	31	0	岡林商会 株式会社

支 払 一 覧 表

2003年 1月20日 1頁

< 締日 末日 >

仕入集計期間 2002年 8月 1日 ~ 2002年 8月31日

支 払 先 名	前月残	現 金	小切手	振 込	手 形	相 殺	値引き	その他	消費税	繰越額	当月仕入額	支 払 残
0001 東東電材株式会社	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,280	2,145,280
0002 本丸電材株式会社	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	448,658	448,658
0003 二の丸鋼管株式会社	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	56,190	56,190
0004 石田機材株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	34,000
0006 ABCD機材有限会社	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,865	1,705,865
0008 株式会社 森田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,950	285,950
0009 有限会社 林電材	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000
0011 株式会社 北白川管材	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	540,620	590,620
0001 株式会社武富塗装工業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,207,000	3,207,000
0002 有限会社中田土木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	560,000
0001 イワイ事務機	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	254,500	254,500
0002 株式会社 野上文具店	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 石峰リース	77,500	0	0	0	77,500	0	0	0	0	0	45,000	45,000
【 合 計 】	607,500	210,000	70,000	150,000	127,500	0	0	0	0	50,000	9,543,063	9,593,063

買掛残高一覧表

2003年 1月20日 1 頁

集計期間： 2002年 8月 1日～2002年 8月31日

コード	仕入先名	繰越残高	支払額	調整額	支払合計額	仕入額	差引残高
0001	東東電材株式会社	50,000	50,000	0	50,000	2,145,280	2,145,280
0002	本丸電材株式会社	100,000	100,000	0	100,000	448,658	448,658
0003	二の丸鋼管株式会社	150,000	150,000	0	150,000	56,190	56,190
0004	石田機材株式会社	0	0	0	0	34,000	34,000
0005	商会株式会社	0	0	0	0	138,370	138,370
0006	ABCD機材有限公司	60,000	60,000	0	60,000	1,705,865	1,705,865
0008	株式会社 森田	0	0	0	0	285,950	285,950
0009	有限会社 林電材	0	0	0	0	260,000	260,000
0011	株式会社 北白川管材	50,000	0	0	0	540,620	590,620
0012	株式会社 岸田工業	50,000	0	0	0	93,540	143,540
0001	株式会社武富塗装工業	0	0	0	0	3,207,000	3,207,000
0002	有限会社中田土木	0	0	0	0	560,000	560,000
0001	イワイ事務機	50,000	50,000	0	50,000	254,500	254,500
0002	株式会社 野上文具店	70,000	70,000	0	70,000	0	0
0003	石峰リース	77,500	77,500	0	77,500	45,000	45,000
	【 合 計 】	657,500	557,500	0	557,500	9,774,973	9,874,973
